



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 20/2022

**ASSUNTO:** SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO SISTEMA ZONA OESTE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

**PROCESSO:** SEI E-12/003.126/2017- CEDAE


Foi realizada visita técnica, em 15/06/2022, nos locais de implantação sistema de abastecimento de águas do sistema Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, para verificação do andamento das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Sistema Zona Oeste - Setor Guaratiba II.

A vistoria foi realizada em conjunto com Técnicos da CEDAE, Andre Cruzeiro da Silva, Gerência de Fiscalização de Obras do Sistema de Abastecimento de Água, Douglas do Rosário Silva, Assistente da Diretoria Técnica e de Projeto e outros.

O sistema de Abastecimento de Água do Sistema Zona Oeste será abastecido por água tratada pela Estação de Tratamento do Guandu, sendo transportada do Reservatório Marapicu através da Adutora da Rural, DN 1500mm, onde será feita uma interligação para abastecer o sistema proposto.

As obras de assentamento estão aproximadamente com 11,50 km de troncos distribuidores de água com diâmetros variando entre 250mm e 800mm, cerca de 70% da extensão total, segundo o engenheiro da CEADE. As intervenções vão beneficiar o bairro de Guaratiba e Sepetiba.

### GUARATIBA 02

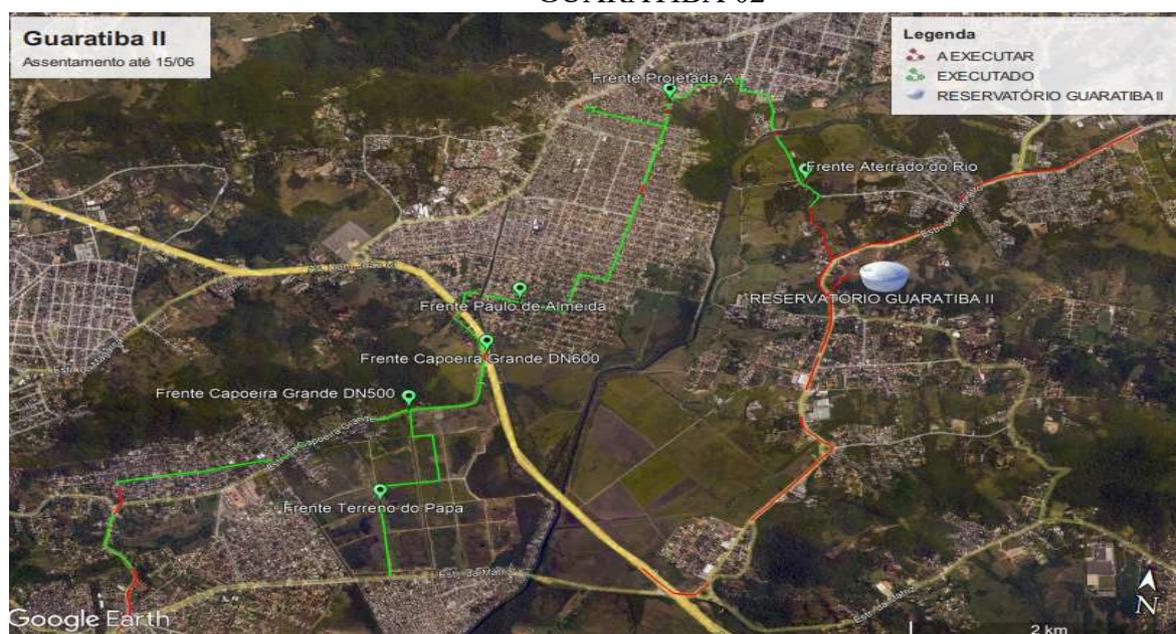



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro



*Assentamento de tronco distribuidor, com diâmetro de 600mm na Estrada da Capoeira Grande*



*Demolição de material de 3ª categoria na Rua Aterrado do Rio*



## Reservatório Guaratiba II

O reservatório de Guaratiba II, com capacidade total de 10.000m<sup>3</sup>, dividido em duas câmaras de 5000m<sup>3</sup> cada, será construído no Morro Cavada, próximo a Estrada do Mato Alto no Bairro de Guaratiba. Segundo Engenheiro da CEDAE, Andre Cruzeiro da Silva, o reservatório estará concluído somente no final de Dezembro/2022 ou início de Janeiro/2023.



*Serviços de levantamento topográfico na Região do Reservatório Guaratiba II*

## Cronograma Físico-Financeiro

O cronograma físico-financeiro apresentado pela CEDAE, em 15 de junho de 2022, de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Sistema Zona Oeste - Setor Guaratiba II aponta a finalização total das obras em novembro de 2023.

Considerando que 70% das obras de assentamento de troncos distribuidores de água com diâmetros variando entre 250mm e 800mm do Sistema Zona Oeste do município do Rio de Janeiro encontrasse concluído e que até final de dezembro/2022 a obras de assentamento e a instalação do reservatório estará terminado.

Considerando que as obras Sistema Zona Oeste do município do Rio de Janeiro estão de andamento conforme cronograma físico apresentado



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Diante do exposto e nada tendo a acrescentar sob o aspecto técnico, encerra-se este parecer com o entendimento de que a Companhia, com a apresentação das informações complementares, de forma satisfatória, atendeu às solicitações requeridas.

Rio, 01/07/2022

**Carlos Augusto Barbosa Pessoa**  
Engenheiro / CASAN  
ID 2146305-0

**Robson Cardinelli**  
Gerente da Câmara de Saneamento  
ID 4184220-0
