


1 - RF CASAN N°: 145/2023	2 - Data da Fiscalização: 16 /05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: RIO + SANEAMENTO - Bloco 3
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Realesa s/n, ao lado do Mercado Super Rede, Cosmo	5 - Bairro(s): Santa Cruz	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Descrever e detalhar as condições operacionais da Estação Elevatória de Água Tratada Realeza, a cargo da Concessionária. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
8 – Representes designados pela Concessionária: Elias Martins (Coordenador de Operação) Ivan Souza Renato Maia Welington Guimarães		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 12214 12218		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Luiz Henrique Vieira Silva	13 – ID Funcional: 5132859-3	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2023 <p style="text-align: center;">_____ Luiz Henrique V. silva Engenheiro - CASAN ID 5132859-3</p> <p>De acordo</p> <p style="text-align: center;">_____ Robson Cardinelli Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID -4184220-0</p>		

15- DESCRIÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EEAT)

A EEAT Realeza é “volante”, ou seja, uma elevatória transportável que operacionalmente é utilizada em mais de um ponto por motivos econômicos ou emergenciais quando o sistema está se recuperando e a retaguarda é insuficiente. Neste caso estacionou-se uma “bomba volante” e a utilizam de forma constante. Para isso abandonou-se a parte do gerador e solicitou-se ligação elétrica.

16. IMAGEM AÉREA

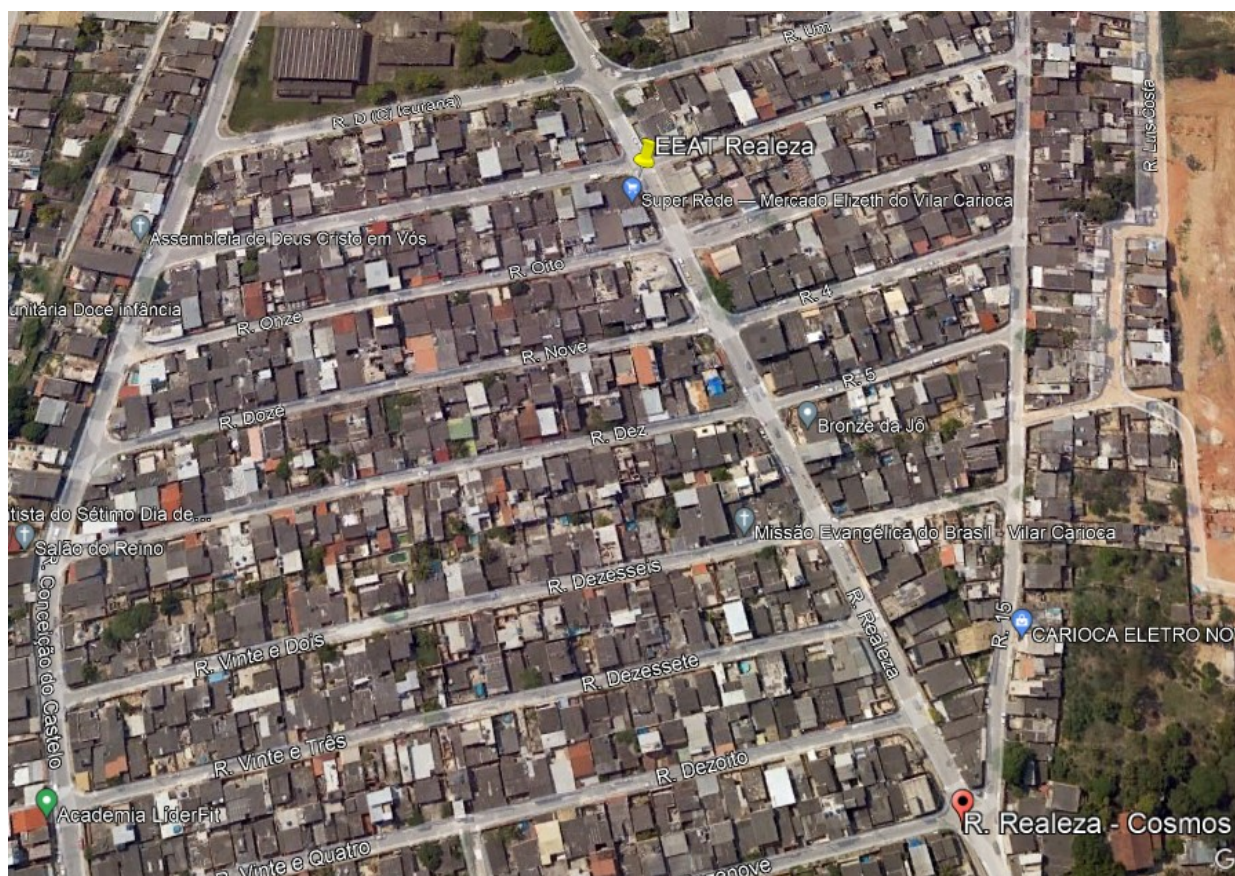

17. CHECK LIST (ÁGUA POTÁVEL)

DESCRIÇÃO - EEE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação		X	
02. Cercado e Isolado			X
03. Condições de conservação, limpeza	X		
04. Condições da estrutura e alvenaria			X
05. Condições de acesso externo/iluminação			X

06. Condições da base das bombas	X		
07. Condições da laje de cobertura/ tampão F°F°			X
08. Esquadrias e ventilações			X
09. Condições da tubulação de entrada		X	
10. Condições da tubulação de saída	X		
11. Sensor de pressão ou manômetro		X	
12. Válvula de retenção do requalque		X	
13. Macromedidor		X	
14. Válvula Gaveta/ Borboleta		X	X
15. Grupo reserva	X		
16. Monovia, talha			X
17. Drenagem da caixa da EEAT			X
18. Estanqueidade das tubulações e bomba	X		
19. Quadro de Comando, Telemetria		X	
20. Instalações elétricas/ padrão		X	

18. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



Local

EEAT Realeza, abastece logradouro de mesmo nome e adjacências. Concessionária projeta abrigo definitivo para elevatória.

FOTO 2



Local
Medição

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deverá avançar na montagem eletromecânica definitiva para segurança do sistema. Nada mais a acrescentar nesta oportunidade, a CASAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que possam a vir referente ao relatório.
