


<b>1 - RF CASAN N°:</b> 148/2023	<b>2 - Data da Fiscalização:</b> 04/05/2023	<b>3 - Concessionária Fiscalizada:</b> RIO + SANEAMENTO - Bloco 3
<b>4 - Endereço da Fiscalização:</b> Rua São Dagoberto	<b>5 - Bairro(s):</b> Realengo	<b>6 - Município:</b> Rio de Janeiro
<b>7 - Objetivo da Fiscalização:</b> Descrever e detalhar as condições operacionais da Estação Elevatória de Água Tratada São Dagoberto, a cargo da Concessionária. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
<b>8 – Representes designados pela Concessionária:</b> Armindo Bruno de Jesus – Supervisor de Operações Jean Carlos Martins – Operador		
<b>9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b> Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
<b>10 - Norma(s) Aplicável(eis):</b> ABNT NBR 12214 12218		
<b>11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b> Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
<b>12 – Nome do Agente de Fiscalização:</b> Luiz Henrique Vieira Silva	<b>13 – ID Funcional:</b> 5132859-3	
<b>14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b> Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de junho de 2023  <p style="text-align: center;">_____ <b>Luiz Henrique V. Silva</b> Engenheiro - CASAN ID 5132859-3</p> <p>De acordo</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>Robson Cardinelli</b> Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID -4184220-0</p>		

## **15- DESCRIÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EEAT)**

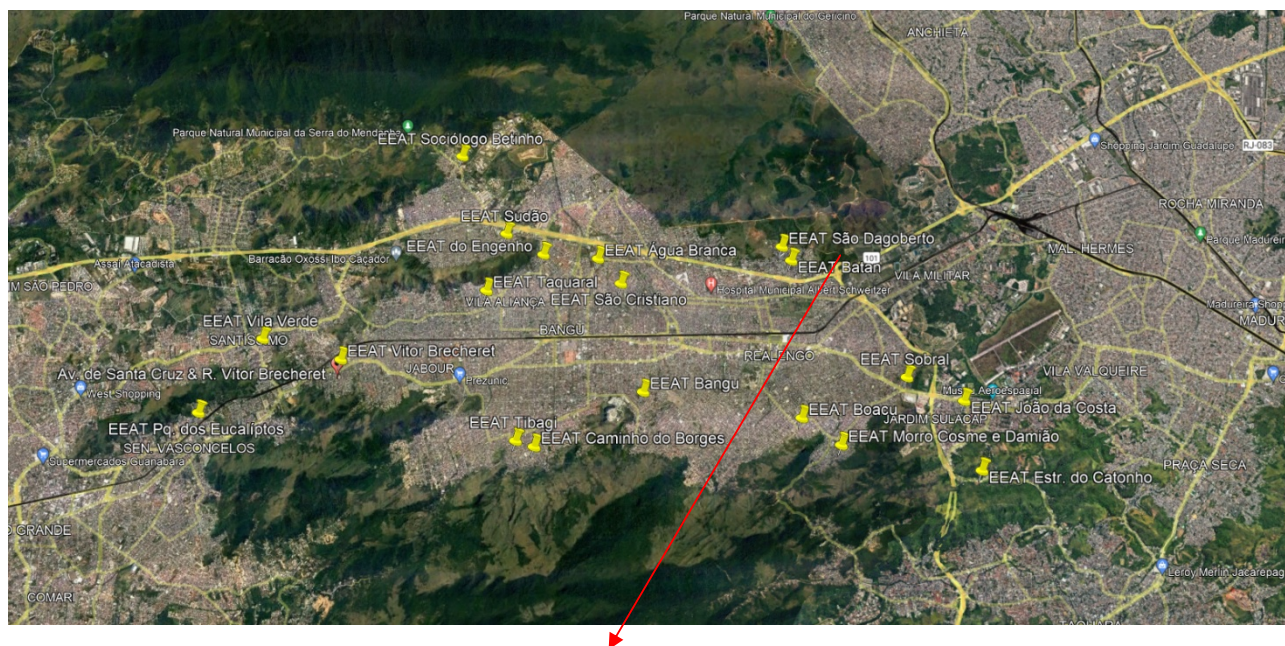

**EEAT São Dagoberto**

## **16. CHECKLIST (ÁGUA POTÁVEL)**

DESCRIÇÃO - EEAT	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação		X	
02. Cercado e Isolado	X		
03. Condições de conservação, limpeza			
04. Condições da estrutura e alvenaria			X
05. Condições de acesso externo/iluminação			X
06. Condições de acesso interna		X	
07. Condições da laje de cobertura/tampão F°F°	X		
08. Esquadrias e ventilações			X
09. Condições da tubulação de entrada		X	
10. Condições da tubulação de saída	X		
11. Sensor de pressão ou manômetro	X		
12. Válvula de retenção do requalque			X
13. Macromedidor			X
14. Válvula Gaveta/ Borboleta			X
15. Grupo reserva		X	
16. Monovia, talha			
17. Drenagem da caixa da EEAT			X
18. Estanqueidade das tubulações e bomba	X		

19. Quadro de Comando, Telemetria	X		
20. Instalações elétricas/ padrao	X		

## 17. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



Local

**EEAT São Dagoberto** bem montada com eletromecânica dentro dos padrões de qualidade. O grupo moto-bomba que parece pequeno, mas esta atendendo a demanda.

## 18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elevatória esta operando como a antiga Concessionária as entregou, porém precisam de identificação da Rio + Saneamento para que os usuário saibam a quem reclamar, porque acreditam ser da Cedae a responsabilidade, e como não conseguem resolver seus problemas de falta d'água procuram a mídia.

A EEAT precisa de manutenção, como vimos nas fotografias, seja de: limpeza, pintura, identificação, instalações elétricas, drenagem das caixas, nivelamento de tampões e substituições dos quebrados. A Rio + Saneamento informou que o setor de projeto está preparando remodelação da EEAT com inversor de frequência, telemetria e novos quadros de comando, porém todo projeto se desenvolve no tempo, e até que seja contemplada uma elevatória deveria sofrer manutenções preventivas e corretivas.

Nada mais a acrescentar nesta oportunidade, a CASAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que possam a vir referente ao relatório.
