




1 - RF CASAN N°: 150/2023	2 - Data da Fiscalização: 16 /05/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: RIO + SANEAMENTO - Bloco 3
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Seabra Filho esquina Rua Zélia Magalhães, Cosmos, Rio de Janeiro, RJ	5 - Bairro(s): Santa Cruz	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Descrever e detalhar as condições operacionais da Estação Elevatória de Água Tratada Seabra Filho , a cargo da Concessionária. A ação de fiscalização direta foi realizada por profissionais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
8 – Representes designados pela Concessionária: Elias Martins (Coordenador de Operação) Ivan Souza Renato Maia Welington Guimarães		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): ABNT NBR 12214 12218		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Luiz Henrique Vieira Silva	13 – ID Funcional: 5132859-3	
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023		
 Luiz Henrique V. Silva Engenheiro - CASAN ID 5132859-3		
De acordo		
 Robson Cardinelli Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID -4184220-0		

15- DESCRIÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT)

A EEAT Seabra Filho foi implantada para abastecer Condomínio Residencial Águas do Alvorada, como forma de aprovação do empreendimento . Mas após sua construção foi doada a Concessionária e e esta é responsável pela guarda , operação e manutenção.

16. IMAGEM AÉREA

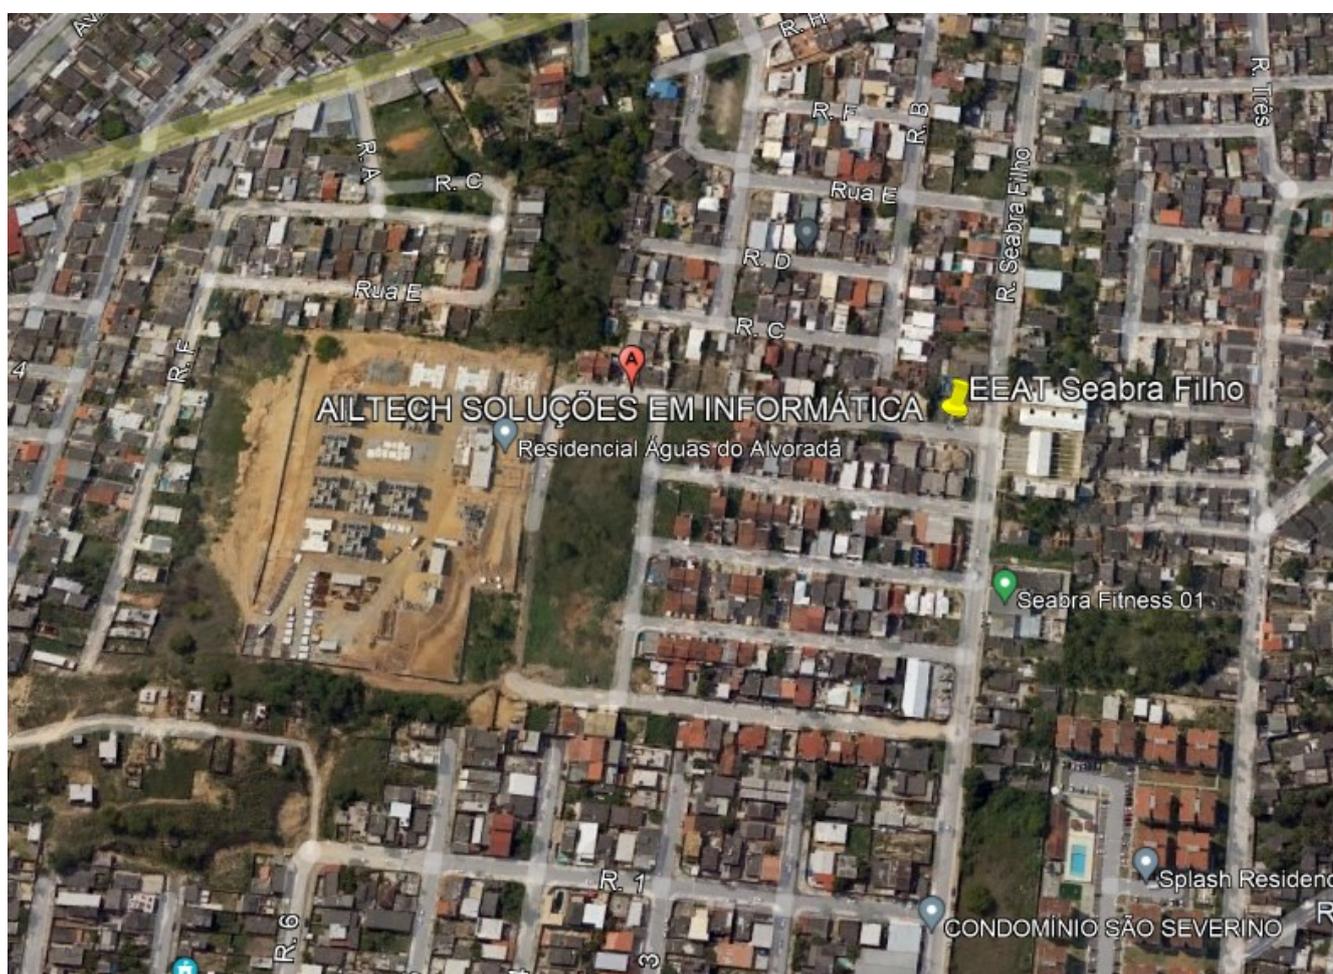

17. CHECK LIST (ÁGUA POTÁVEL)

DESCRIÇÃO - EEE	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação		X	
02. Cercado e Isolado			X
03. Condições de conservação, limpeza		X	

04. Condições da estrutura e alvenaria			X
05. Condições de acesso externo/iluminação			X
06. Condições da base das bombas	X		
07. Condições da laje de cobertura/tampao F°F°	X		
08. Esquadrias e ventilações			X
09. Condições da tubulação de entrada	X		
10. Condições da tubulação de saída	X		
11. Sensor de pressão ou manômetro		X	
12. Válvula de retenção do requalque		X	
13. Macromedidor		X	
14. Válvula Gaveta/ Borboleta	X		
15. Grupo reserva		X	
16. Monovia, talha			X
17. Drenagem da caixa da EEAT		X	
18. Estanqueidade das tubulações e bomba	X		
19. Quadro de Comando, Telemetria		X	
20. Instalações elétricas/ padrão		X	

18. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



Local

EEAT Seabra Filho : abastece condomínio. Não tem drenagem. É operada pelo próprio condomínio de forma manual. Bomba pirulito.

FOTO 2



Local

Medição e quadro de comando
da EEAT Seabra Filho

FOTO 3



Local

Falta recompor pavimento
(calçada e asfalto)

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Concessionária deverá assumir a operação da EEAT porque é de sua responsabilidade e finalizar a construção, bem como implantar melhorias com informou na vistoria. Nada mais a acrescentar nesta oportunidade, a CASAN está a disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que possam a vir referente ao relatório.
