



<b>1- RF CASAN Nº:</b> 187/2023	<b>2 – Data da Fiscalização:</b> 10/07/2023	<b>3 – Concessionária Fiscalizada:</b> CAJ
<b>4 – Endereço da Fiscalização:</b> Rdv Amaral Peixoto, S/Nº	<b>5 – Bairro(s):</b> Pontinha	<b>6 - Município:</b> Araruama/RJ
<b>7 – Objetivo da Fiscalização:</b> Descrever e detalhar as condições operacionais da Estação Elevatória de Esgoto, a cargo da Concessionária Águas de Juturnaíba. A ação de fiscalização direta foi realizada por fiscais credenciados, visando determinar o grau de conformidade do sistema auditado.		
<b>8 – Representantes designados pela Concessionária:</b> Jean Marins monteiro – Técnico de Processos 2 Ozéias Eduardo F. Silva – Operador 1		
<b>9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b> Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
<b>10 – Norma(s) Aplicável(eis):</b> ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. ABNT NBR 12214 - Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de água. Portaria GM/MS nº 888/21 – Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.		
<b>11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b> Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
<b>12 – Nome do Agente de Fiscalização:</b> Luiz Daniel Silva de Sá Equipe Casan – Iguaba . Marcio Cury	<b>13 – ID Funcional:</b> 51349213 51328852	
<b>14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b> Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de julho de 2023   <b>Luiz Daniel Silva de Sá</b> Assistente / CASAN ID 51349213  De acordo   <b>Robson Cardinelli</b> Gerente da Câmara Técnica de Saneamento ID 4184220-0		

**15. DESCRIÇÃO DA EEE**

A Elevatória **Pirata** faz parte do Sistema de Esgotamento Sanitário **Ponte dos Leites**, em Araruama, RJ. A elevatória é subterrânea, porte pequeno, possui vazão média de 144,0 m<sup>3</sup>/h e realiza o recalque através de 2 conjuntos de motobombas (1+1R) com 20.0 (CV) de potência cada, modelo (FLYGT 3153), trabalhando de acordo com o nível de variação do poço. O nível do poço é medido com o auxílio de um sensor de nível (bóia). O seu funcionamento no sistema de esgotamento da ETE **Ponte dos Leites**, está indicado na figura a seguir:

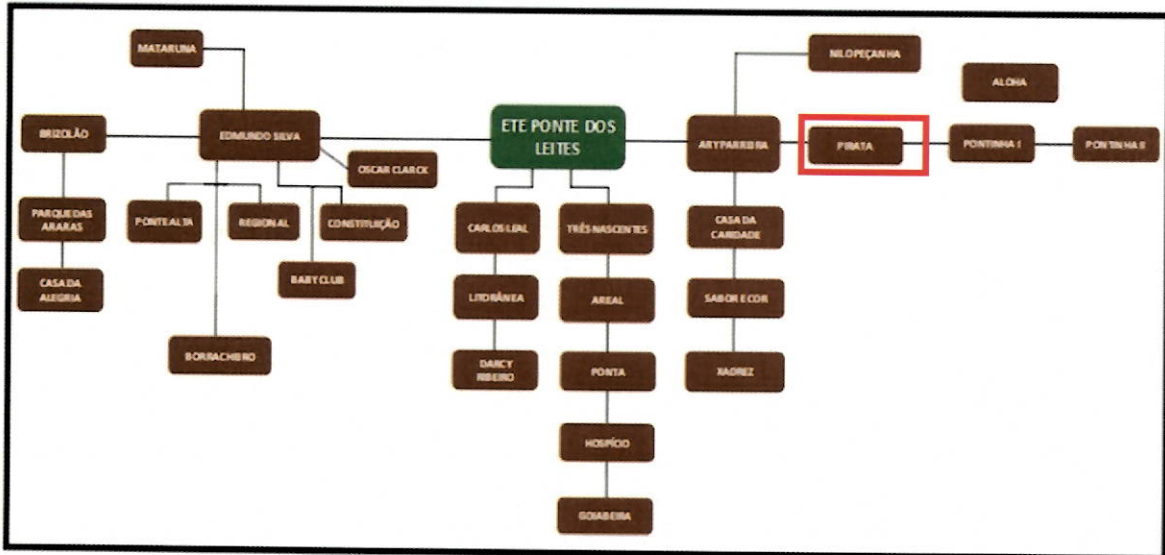


Figura 1 – Fluxograma do sistema de esgoto do Município de Araruama – Águas de Juturnaíba.

**16. CHECK LIST**

DESCRIÇÃO - EEEB	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Placa de identificação	X		
02. Cercado e Isolado	X		
03. Iluminação		X	
04. Válvula de entrada / Comporta	X		
05. Caixa receptora	X		
06. Extravasor		X	
07. Gradeamento	X		
08. Pannel elétrico – Gradeamento			X
09. Poço de sucção		X	
10. Sensor de nível	X		
11. Conjunto Motobomba	X		
12. Pannel elétrico – CMB	X		
13. Válvula de retenção	X		
14. Tubulações	X		
15. Válvula de saída (recalque)	X		
16. Gerador de energia elétrica			X
17. Estrutura para operador			X
18. Guarda-corpo			X
19. Condições de conservação	X		
20. Condições estruturais (civil)	X		

### 16.1. NÃO CONFORMIDADES

- 03. Local sem iluminação, utilizam a iluminação pública (poste);
- 06. Aparentemente sub-dimensionado;
- 09. Tampa com material inadequado (ripas de madeira);

### 16.2. NÃO SE APLICA

- 08. Não há, gradeamento manual;
- 16. Não há, utilizam um gerador móvel caso haja necessidade;
- 17. Não há operador fixo;
- 18. Não há necessidade.

## 17. RELATORIO FOTOGRAFICO

NÃO CONFORMIDADE

FOTO 1

Não observada.



Local

Placa de Identificação da elevatória.

Recomendação Técnica

NÃO CONFORMIDADE

FOTO 2

Não observada.



Local

Painel elétrico.

Recomendação Técnica



FOTO 3

NÃO CONFORMIDADE

Tampas inadequadas dos poços (ripas de madeira).



Local

CX Receptora, poço e bombas submersas.


Recomendação Técnica

- Manter a limpeza do local.

FOTO 4

NÃO CONFORMIDADE

Não observado

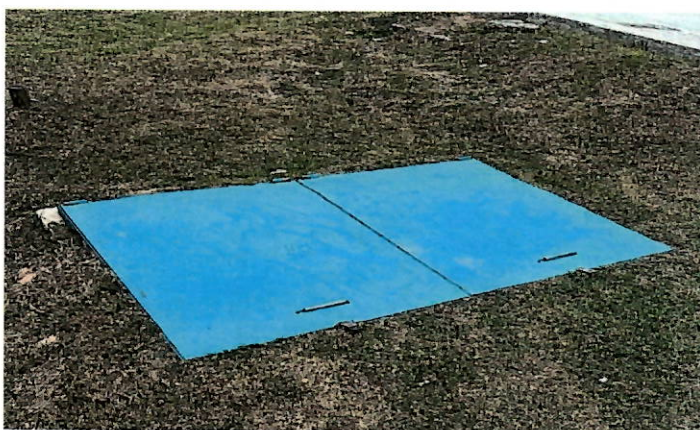

Local

Sistema de recalque

Recomendação Técnica

- Providenciar manutenção no local.

## 18. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Adotar providências quanto às constatações mencionadas neste relatório, a fim de atender as normas.

Abaixo veremos as recomendações técnicas, além daquelas dispostas no item 17:

- a) Providenciar sistema de iluminação;
- b) Providenciar limpeza;
- c) Providenciar substituição das tampas de ripa de madeira por material adequado;
- d) Providenciar manual com plano de contingência.



**19. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

De acordo com o que foi observado na vistoria técnica e demonstrado no presente relatório, pode-se constatar que a estação elevatória carece de manutenção.

A Estação está devidamente identificada, contudo, esta carece de sistema de iluminação adequado para trabalhos noturnos. A Tampa dos poços não é apropriada para o local, pois traz risco de acidente.

Nas próximas fiscalizações serão novamente vistoriadas as instalações físicas, assim como as questões afetas aos investimentos a serem realizados.

Nada mais a acrescentar sob o aspecto técnico, ocasião em que encerra este relatório com base no que consta nos autos.

